Projektnummer:

Bauzeitenplan

AWB Unterumbach - Kanaltruppe 2 - der BZP basiert auf einen ungestörten Ablauf

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	**Bauabschnitt 2.2.2 - Kanalbautruppe 2 - Bergstraße RW**			
2	UU12-UUR111 STB DN 300 HL= 6,37m - kein GW	3at	Mo, 19.02.24	Mi, 21.02.24
3	UUR111-UUR110 STB DN 300 HL= 21,10m - kein GW	3at	Do, 22.02.24	Mo, 26.02.24
4	UUR110-UUR108 STB DN 300 HL= 19,00m - kein GW	3at	Di, 27.02.24	Do, 29.02.24
5	UUR108-UUR107 STB DN 300 HL= 31,50m - kein GW	5at	Fr, 01.03.24	Do, 07.03.24
6	UUR107-UUR105 STB DN 300 HL= 35,00m - kein GW	6at	Fr, 08.03.24	Fr, 15.03.24
7	UUR105-UUR104 STB DN 300 HL= 14,00m - kein GW	2at	Mo, 18.03.24	Di, 19.03.24
8	UUR107-UUR106 STB DN 300 HL= 24,00m - kein GW	4at	Mi, 20.03.24	Mo, 25.03.24
9	UU35-UU39 STZ DN 250 HL= 21,00m - kein GW	4at	Di, 26.03.24	Di, 02.04.24
10	Hausanschlüsse 7 Stk - kein GW	6at	Mi, 03.04.24	Mi, 10.04.24
11	**Bauabschnitt 3.2.2 - Kanalbautruppe 2 - Ziegelstatt RW**			
12	UU17-UUR69 STB DN 400 HL= 3,50 m - kein GW	2at	Do, 11.04.24	Fr, 12.04.24
13	UUR69-UUR68 STB DN 400 HL= 47,00m - kein GW	12at	Mo, 15.04.24	Di, 30.04.24
14	UUR68-UUR67 STB DN 400 HL= 13.00m - kein GW	4at	Do, 02.05.24	Di, 07.05.24
15	UUR67-UUR66 STB DN 400 HL= 11,50m - kein GW	3at	Mi, 08.05.24	Mo, 13.05.24
16	UUR66-UUR6A STB DN 400 HL= 21,00m - kein GW	6at	Di, 14.05.24	Mi, 22.05.24
17	UUR66A-UUR65 STB DN 400 HL= 26,00m - kein GW	8at	Do, 23.05.24	Di, 04.06.24
18	UUR65-UUR63A STB DN 300 HL= 21,00m - kein GW	4at	Mi, 05.06.24	Mo, 10.06.24
19	UUR65-UUR64 STB DN 300 HL= 8,50m - kein GW	3at	Di, 11.06.24	Do, 13.06.24
20	UUR64-UUR63 STB DN 300 HL= 28,00m - kein GW	9at	Fr, 14.06.24	Mi, 26.06.24
21	Hausanschlüsse 11 Stk - kein GW	10at	Do, 27.06.24	Mi, 10.07.24
22	**Bauabschnitt 3.3.1 - Kanalbautruppe 3 - Provisorische Trinkwasserleitung Nußbaumstraße**			
23	Provisorische Trinkwasserleitung Verlegung+Zusammenschluss	9at	Fr, 28.06.24	Mi, 10.07.24
24	**Bauabschnitt 3.3.1 - Kanalbautruppe 2 - Nußbaumstraße RW**			
25	UUR27-UUR26 STB DN 400 HL= 3,90m - kein GW	2at	Do, 11.07.24	Fr, 12.07.24
26	UUR26-UUR134 STB DN 300 HL= 39,30m - kein GW	12at	Mo, 15.07.24	Di, 30.07.24
27	UUR134-UUR133 STB DN 300 HL= 39,30m - kein GW	22at	Mi, 31.07.24	Fr, 30.08.24
28	Betriebsurlaub 12.08.24-23.08.2024	9at	Mo, 12.08.24	Fr, 23.08.24
29	UUR133-UUR132 STB DN 300 HL= 16,80m - kein GW	5at	Fr, 30.08.24	Do, 05.09.24
30	UUR132-UUR131 STB DN 300 HL= 3,50m - kein GW	2at	Fr, 06.09.24	Mo, 09.09.24
31	UUR131-UUR130 STB DN 300 HL= 14,50m - kein GW	5at	Di, 10.09.24	Mo, 16.09.24
32	UUR130-UUR129 STB DN 300 HL= 8,50m - kein GW	3at	Di, 17.09.24	Do, 19.09.24
33	Hausanschlüsse 4 Stk	4at	Fr, 20.09.24	Mi, 25.09.24
34	Bauabschnitt 3.1 - Kanalbautruppe 2 - Holzstraße SW			
35	UUS26-UUS25 STZ DN 250 HL=49,00m kein GW	14at	Do, 26.09.24	Mi, 16.10.24
36	UUS25-UUS24 STZ DN 250 HL= 42,50m kein GW - mit Zufülltrupp	6at	Do, 17.10.24	Do, 24.10.24
37	UUS24-UUS23 STZ DN 250 HL= 33,00m - kein GW - mit Zufülltrupp	5at	Fr, 25.10.24	Do, 31.10.24
38	UUS23-UUS22 STZ DN250 HL= 35,00m - kein GW - mit Zufülltrupp	6at	Mo, 04.11.24	Mo, 11.11.24
39	UUS22-UUS21 STZ DN250 HL= 5,00m - kein GW - mit Zufülltrupp	2at	Di, 12.11.24	Mi, 13.11.24
40	UUS21-UUS20 STZ DN250 HL= 39,00m - kein GW - mit Zufülltrupp	6at	Do, 14.11.24	Do, 21.11.24
41	Hausanschlüsse 10 Stk	6at	Fr, 22.11.24	Fr, 29.11.24

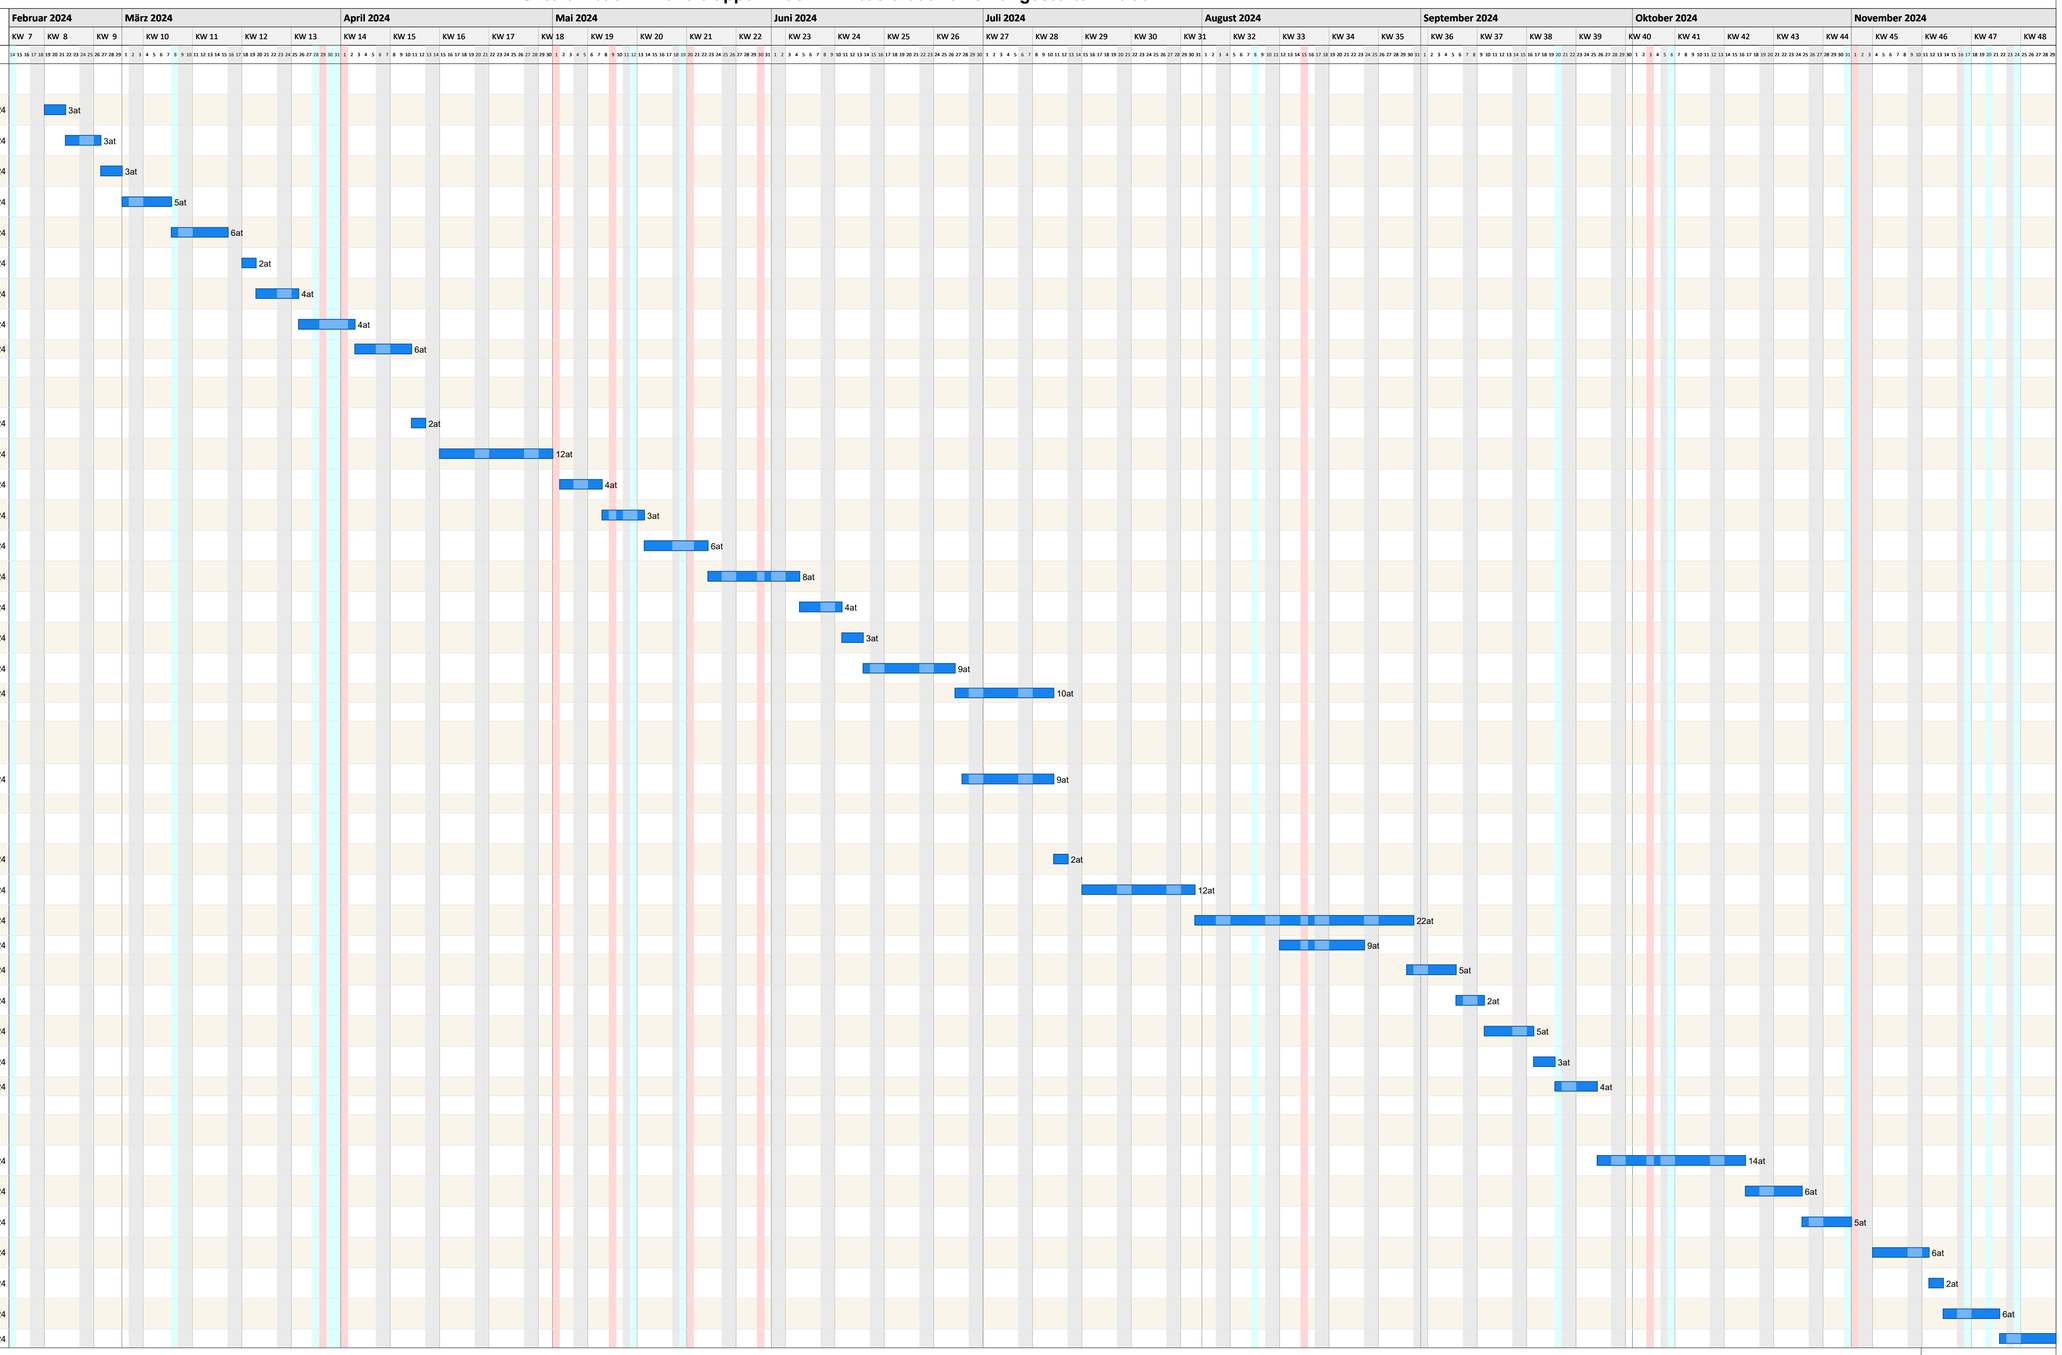

Projektzeitrahmen von Fr, 03.03.23 bis Fr, 29.11.24
Kalender: Bayern (eingebettet)
Druckdatum: 26.02.2024 16:31
Filter:
Bearbeiter: 4990

Architektur- und Ingenieurbüro ihre Firma

Königslachener Weg 36
Schrobenhausen
Tel. +49 8252 905250
Fax +49 8252 905250
e-Mail: bau@gebrueder-woehrl.de

ceyoh Tools and Plug 2013.19.4.0.0 - licence for: Gebrüder Wöhrl Ecoroofing GmbH, Schrobenhausen
