Projektnummer:

Bauzeitenplan

# AWB Unterumbach - Kanaltruppe 1 - der BZP basiert auf einen ungestörten Ablauf

| Pos | Vorgang | Dauer | Start | Ende |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Bauabschnitt 2.1 - Kanalbautruppe 1 - Dorfstraße SW** | | | |
| 2 | UUS7-UUS6 STZ DN 250 HL= 29,00m mit WH | 13at | Mo, 12.02.24 | Mi, 28.02.24 |
| 3 | UUS6-UUS5 STZ DN 250 HL= 46,00m mit WH | 19at | Do, 29.02.24 | Di, 26.03.24 |
| 4 | Hausanschlüsse Dorfstraße zwischen Bergstraße und Holzstraße 6 Stk | 6at | Mi, 27.03.24 | Fr, 05.04.24 |
| 5 | **Umleitung umbauen Bereich Holzstraße** | 1at | Fr, 05.04.24 | Fr, 05.04.24 |
| 6 | UUS5-UUS4A STZ DN 250 HL 33,50m mit WH mit Zufüllrupp | 8at | Mo, 08.04.24 | Mi, 17.04.24 |
| 7 | UUS4A-UUS4B STZ DN250 HL 5,00m mit WH mit Zufüllrupp | 3at | Do, 18.04.24 | Mo, 22.04.24 |
| 8 | UUS4A- UUS4 STZ DN 250 HL 9,00m mit WH mit Zufüllrupp | 3at | Di, 23.04.24 | Do, 25.04.24 |
| 9 | UUS4-UUS3 STZ DN 250 HL 58,00m mit WH mit Zufüllrupp | 11at | Do, 25.04.24 | Mo, 13.05.24 |
| 10 | UUS3-UUS27 STZ DN 250 HL= 3,50m mit WH mit Zufüllrupp | 2at | Di, 14.05.24 | Mi, 15.05.24 |
| 11 | UUS3-UUS2 STZ DN 250 HL= 47,00m mit WH mit Zufüllrupp | 9at | Do, 16.05.24 | Mi, 29.05.24 |
| 12 | UUS2-UUS1 STZ DN 250 HL= 37,00m mit WH mit Zufüllrupp | 6at | Fr, 31.05.24 | Fr, 07.06.24 |
| 13 | UUS1-UU19 STZ DN 250 HL= 5,30m mit WH mit Zufüllrupp | 3at | Mo, 10.06.24 | Mi, 12.06.24 |
| 14 | Hausanschlüsse 10 Stk | 10at | Do, 13.06.24 | Mi, 26.06.24 |
| 15 | **Bauabschnitt 2.1 - Kanalbautruppe 1 - Dorfstraße RW** | | | |
| 16 | UUR 27-UUR 26 STB DN 400 HL= 3,90m | 2at | Do, 27.06.24 | Fr, 28.06.24 |
| 17 | UUR26-UUR25 STB DN 300 HL= 56,00m mit Zufüllrupp | 8at | Mo, 01.07.24 | Mi, 10.07.24 |
| 18 | UUR25-UUR26 STB DN 300 HL= 23,50m mit Zufüllrupp | 5at | Do, 11.07.24 | Mi, 17.07.24 |
| 19 | Hausanschlüsse 3 Stk | 3at | Do, 18.07.24 | Mo, 22.07.24 |
| 20 | **Bauabschnitt 3.2.1 - Kanalbautruppe 1 - Privatgrund SW** | | | |
| 21 | UUS4B-UUS4C PP DN 200 HL= 50,60m - kein GW | 5at | Di, 23.07.24 | Mo, 29.07.24 |
| 22 | UUS4C-UUS4D PP DN 200 HL= 48,50m - kein GW | 5at | Di, 30.07.24 | Mo, 05.08.24 |
| 23 | UUS4D-UUS4E PP DN 200 HL= 34,50m - kein GW | 4at | Di, 06.08.24 | Fr, 09.08.24 |
| 24 | UUS4E-UUS4F PP DN 200 HL= 11,50m - kein GW | 2at | Fr, 09.08.24 | Mo, 12.08.24 |
| 25 | **Betriebsurlaub vom 12.08.2024-23.08.2024** | 9at | Mo, 12.08.24 | Fr, 23.08.24 |
| 26 | **Bauabschnitt 3.3.2 - Kanalbautruppe 1 - Bachstraße RW** | | | |
| 27 | UUR126 Ausl.-UUR126 STB DN600 HL= 11,50m - kein GW- mit Zufüllrupp | 3at | Mo, 26.08.24 | Mi, 28.08.24 |
| 28 | UUR126-UUR125 STB DN 600 HL=18,00m - kein GW- mit Zufüllrupp | 3at | Do, 29.08.24 | Mo, 02.09.24 |
| 29 | UUR125-UUR124 STB DN 600 HL= 25,00m - kein GW- mit Zufüllrupp | 4at | Di, 03.09.24 | Fr, 06.09.24 |
| 30 | UUR124-UUR123 STB DN 600 HL= 4,40m - kein GW- mit Zufüllrupp | 1at | Di, 10.09.24 | Di, 10.09.24 |
| 31 | UUR123-UUR122 STB DN 600 HL= 42,00m - kein GW- mit Zufüllrupp | 7at | Mi, 11.09.24 | Do, 19.09.24 |
| 32 | UUR122-UUR121 STB DN 500 HL= 10,00m - kein GW - mit Zufüllrupp | 2at | Fr, 20.09.24 | Mo, 23.09.24 |
| 33 | UUR121-UUR120 STB DN300 HL= 39,00m - kein GW - mit Zufüllrupp | 6at | Di, 24.09.24 | Di, 01.10.24 |
| 34 | UUR120-UUR119 STB DN300 HL= 33,00m - kein GW- mit Zufüllrupp | 5at | Mi, 02.10.24 | Mi, 09.10.24 |
| 35 | UUR121-UUR121A STB DN 500 HL= 11,30m - kein GW- mit Zufüllrupp | 3at | Do, 10.10.24 | Mo, 14.10.24 |
| 36 | Hausanschlüsse 9 Stk | 9at | Di, 15.10.24 | Fr, 25.10.24 |
| 37 | **Bauabschnitt 2.1 - Kanalbautruppe 1 - Dorfstraße RW** | | | |
| 38 | Schacht UUR112 setzen | 4at | Mo, 28.10.24 | Do, 31.10.24 |
| 39 | **Bauabschnitt 3.4.1 - Kanalbautruppe 1 - Dorfstraße DN 250PP in DN 900SB Kanal** | | | |
| 40 | 150,00m PP DN250 mit Abzweige | 10at | Mo, 04.11.24 | Fr, 15.11.24 |
| 41 | **Restarbeiten** | 10at | Mo, 18.11.24 | Fr, 29.11.24 |

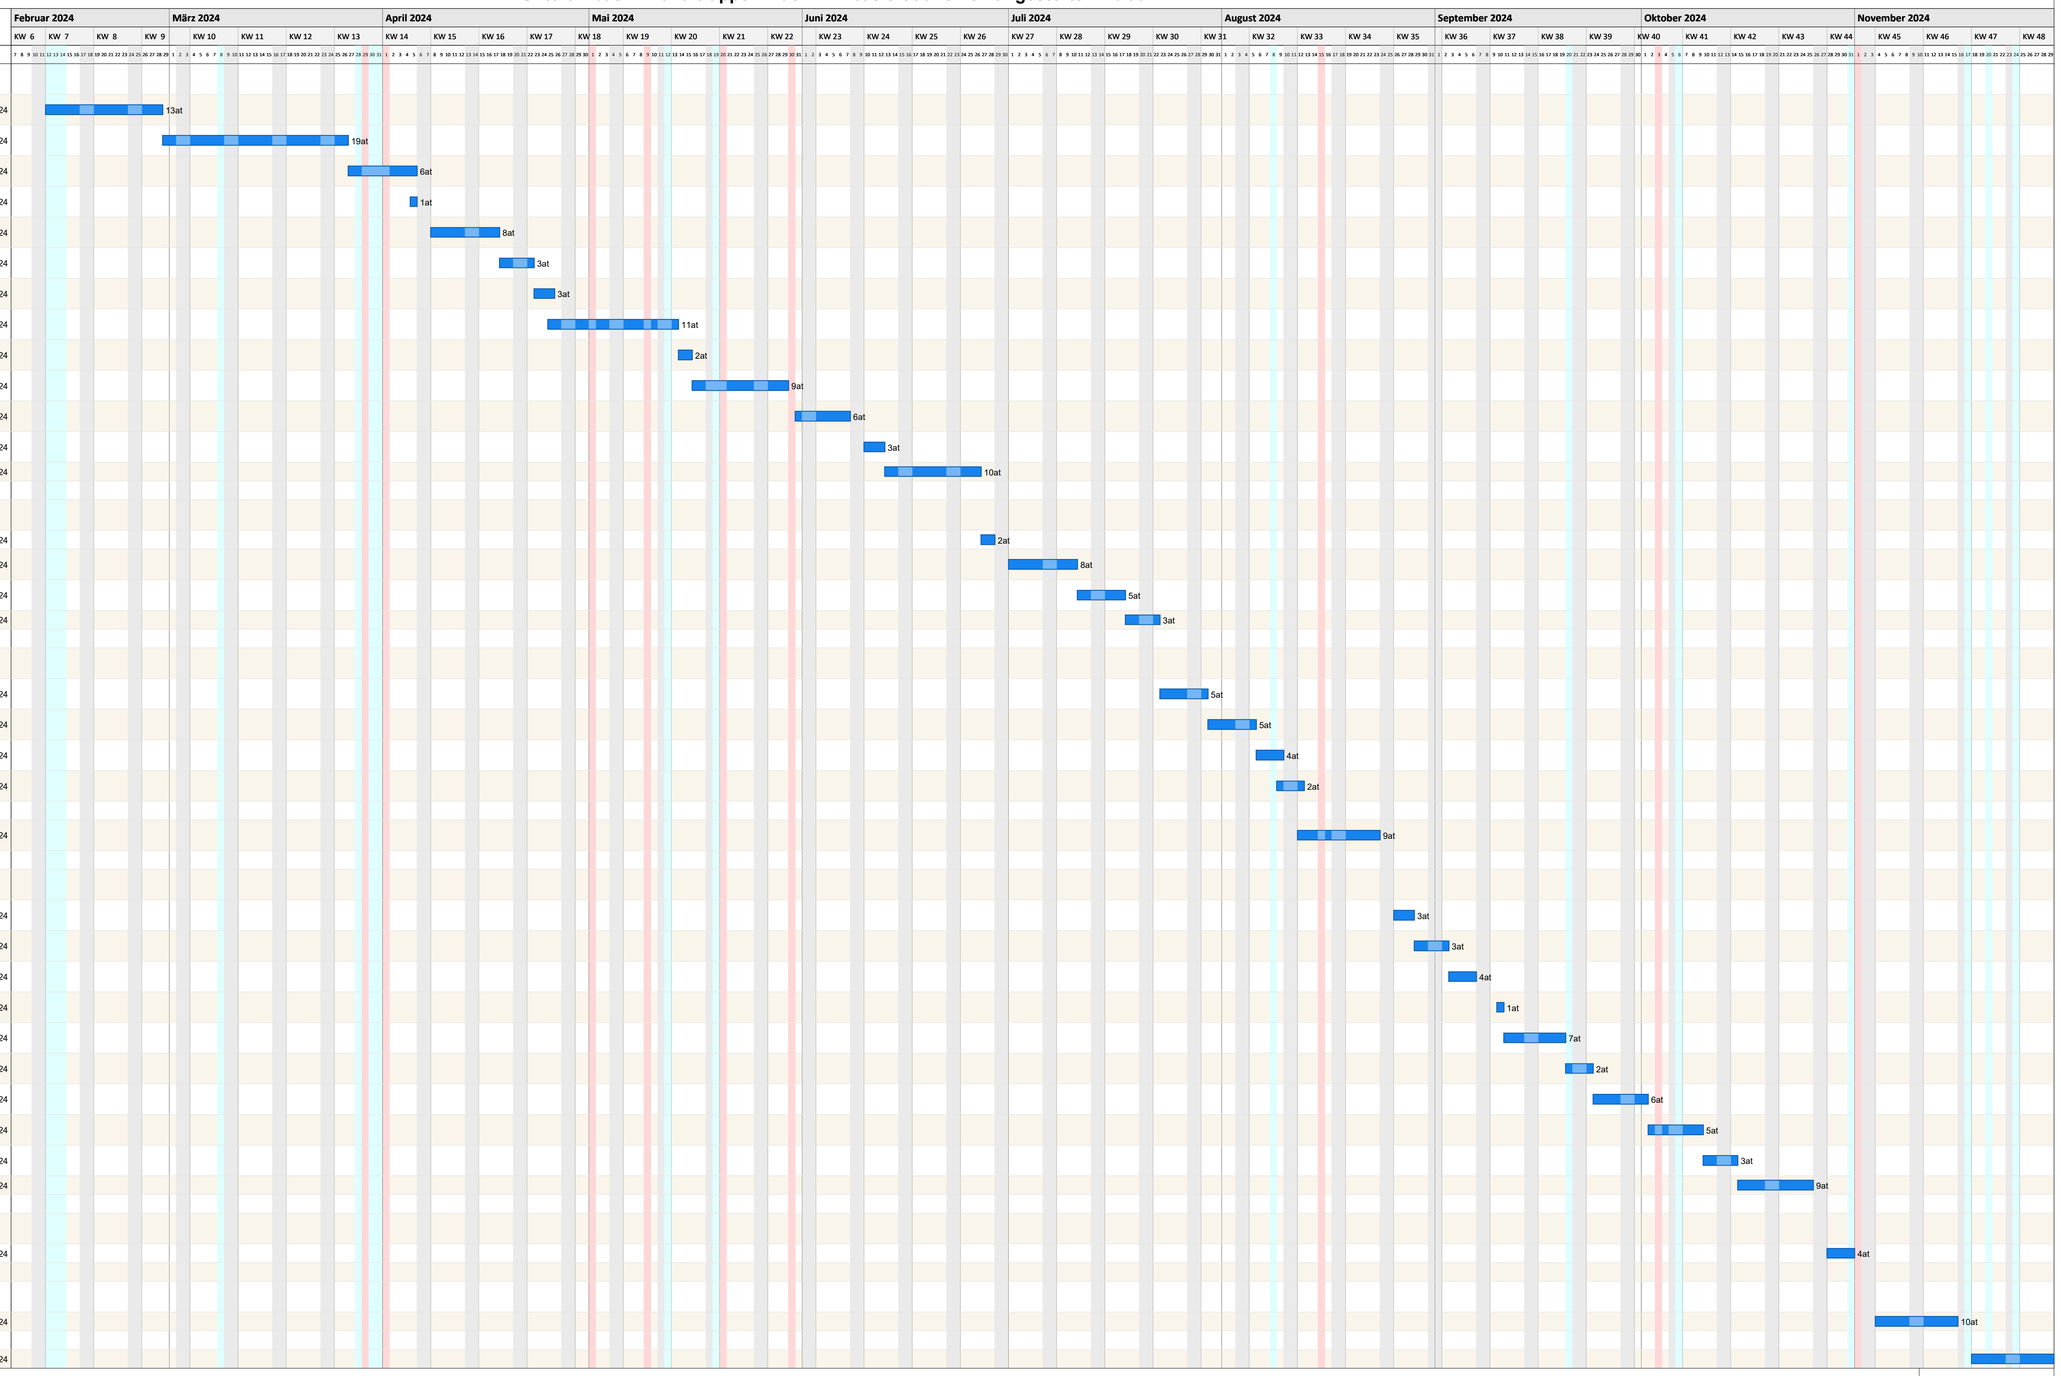


Projektzeitrahmen von Fr, 03.03.23 bis Fr, 29.11.24
Kalender: Bayern (eingebettet)
Druckdatum: 26.02.2024 16:29
Filter:
Bearbeiter: 4990

Architektur- und Ingenieurbüro
ihre Firma
Königslachener Weg 36
Schrobenhausen
Tel. +49 8252 90520
Fax +49 8252 905250
e-Mail: bau@gebrueder-woehrl.de

ceus7v 3dt ent Rev 2011.10.4.0.0 Grafik Nr: 1011.0.1.0012.0.0.0
