Projektnummer:

Bauzeitenplan

AWB Unterumbach - Kanaltruppe 1 - der BZP basiert auf einen ungestörten Ablauf

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	**Bauabschnitt 2.1 - Kanalbautruppe 1 - Dorfstraße SW - Grundwasser**			
2	UUS3-UUS27 STZ DN 250 HL= 3,50m mit WH mit Zufülltrupp	3at	Do, 20.06.24	Mo, 24.06.24
3	UUS3-UUS2 STZ DN 250 HL= 47,00m mit WH mit Zufülltrupp	9at	Di, 25.06.24	Fr, 05.07.24
4	UUS2-UUS1 STZ DN 250 HL= 37,00m mit WH mit Zufülltrupp	7at	Mo, 08.07.24	Di, 16.07.24
5	Hausanschlüsse 10 Stk	10at	Mi, 17.07.24	Di, 30.07.24
6	**Bauabschnitt 2.1 - Kanalbautruppe 1 - Dorfstraße RW - kein Grundwasser**			
7	UUR26-UUR25 STB DN 300 HL= 56,00m mit Zufülltrupp	8at	Mi, 31.07.24	Fr, 09.08.24
8	**Bertriebsurlaub 12.08.2024-30.08.2024**	14at	Mo, 12.08.24	Fr, 30.08.24
9	UUR25-UUR24 STB DN300 HL= 23,50m mit Zufülltrupp	3at	Mo, 02.09.24	Mi, 04.09.24
10	Hausanschlüsse 6 Stk.	6at	Mi, 04.09.24	Mi, 11.09.24
11	**Bauabschnitt 3.3.2 - Kanalbautruppe 1 - Bachstraße RW+SW**			
12	UUR126 Ausl.-UUR126 STB DN600 HL= 11,50m - kein GW- mit Zufülltrupp	2at	Mi, 11.09.24	Do, 12.09.24
13	UUR126-UUR125 STB DN 600 HL=18,00m - kein GW- mit Zufülltrupp	2at	Fr, 13.09.24	Mo, 16.09.24
14	UUR125-UUR124 STB DN 600 HL= 25,00m - kein GW- mit Zufülltrupp	3at	Di, 17.09.24	Do, 19.09.24
15	UUR124-UUR123 STB DN 600 HL= 4,40m - kein GW- mit Zufülltrupp	1at	Fr, 20.09.24	Fr, 20.09.24
16	UUR123-UUR122 STB DN 600 HL= 42,00m - kein GW- mit Zufülltrupp	6at	Mo, 23.09.24	Mo, 30.09.24
17	UUR122-UUR121 STB DN 500 HL= 10,00m - kein GW - mit Zufülltrupp	2at	Di, 01.10.24	Mi, 02.10.24
18	UUR121-UUR120 STB DN300 HL= 39,00m - kein GW - mit Zufülltrupp	6at	Fr, 04.10.24	Fr, 11.10.24
19	UUR120-UUR119 STB DN300 HL= 33,00m - kein GW- mit Zufülltrupp	5at	Mo, 14.10.24	Fr, 18.10.24
20	UUR121-UUR121A STB DN 500 HL= 11,30m - kein GW- mit Zufülltrupp	3at	Mo, 21.10.24	Mi, 23.10.24
21	UUS29-UUS30 STZ DN250 HL=7,00m auf Bestand	4at	Do, 24.10.24	Di, 29.10.24
22	Hausanschlüsse 9 Stk	9at	Mi, 30.10.24	Di, 12.11.24
23	**Bauabschnitt 3.3.1 - Kanalbautruppe 4 - Provisorische Trinkwasserleitung Nußbaumstraße**			
24	Provisorische Trinkwasserleitung Verlegung + Zusammenschluss	9at	Mi, 30.10.24	Di, 12.11.24
25	**Bauabschnitt 3.3.1 - Kanalbautruppe 1 - Nußbaumstraße RW**			
26	UUR26-UUR134 STB DN300 HL= 39,30m kein GW + Verlegung Trinkwasserleitung im Kanalgraben, mit Zufülltrupp	8at	Mi, 13.11.24	Fr, 22.11.24
27	UUR134-UUR133 STB DN300 HL= 39,30m kein GW + Verlegung Trinkwasserleitung im Kanalgrabenmit Zufülltrupp	8at	Mo, 25.11.24	Mi, 04.12.24
28	UUR133-UUR132 STB DN300 HL= 16,80m kein GW mit Zufülltrupp	2at	Do, 05.12.24	Fr, 06.12.24
29	UUR132-UUR131 STB DN300 HL= 3,50m kein GW mit Zufülltrupp	1at	Mo, 09.12.24	Mo, 09.12.24
30	UUR131-UUR130 STB DN300 HL= 14,50m kein GW mit Zufülltrupp	2at	Di, 10.12.24	Mi, 11.12.24
31	UUR130-UUR129 STB DN300 HL= 8,50m kein GW mit Zufülltrupp	2at	Do, 12.12.24	Fr, 13.12.24
32	UUR130-UU61F STB DN300 HL=4,93m	2at	Mo, 16.12.24	Di, 17.12.24
33	Hausanschlüsse 4 Stk.	4at	Mi, 18.12.24	Mo, 23.12.24
34	**Betriebsurlaub Winter - 23.12.2024-17.01.2025**			
35	**Zusammenschluss - Kanalbautruppe 1 - RW+SW Kanal auf Bestand, Dorfstraße**			
36	UUS1-UU19 STZ DN250 HL=5,30m mit WH	3at	Mo, 20.01.25	Mi, 22.01.25
37	UUR27-UUR26 STB DN400 HL=3,90m	3at	Do, 23.01.25	Mo, 27.01.25
38	**Bauabschnitt 2.1 - Kanalbautruppe 1- Dorfstraße RW Schacht UUR112**			
39	Schacht UUR112 setzen	4at	Di, 28.01.25	Fr, 31.01.25
40	**Restarbeiten**	15at	Mo, 03.02.25	Fr, 21.02.25

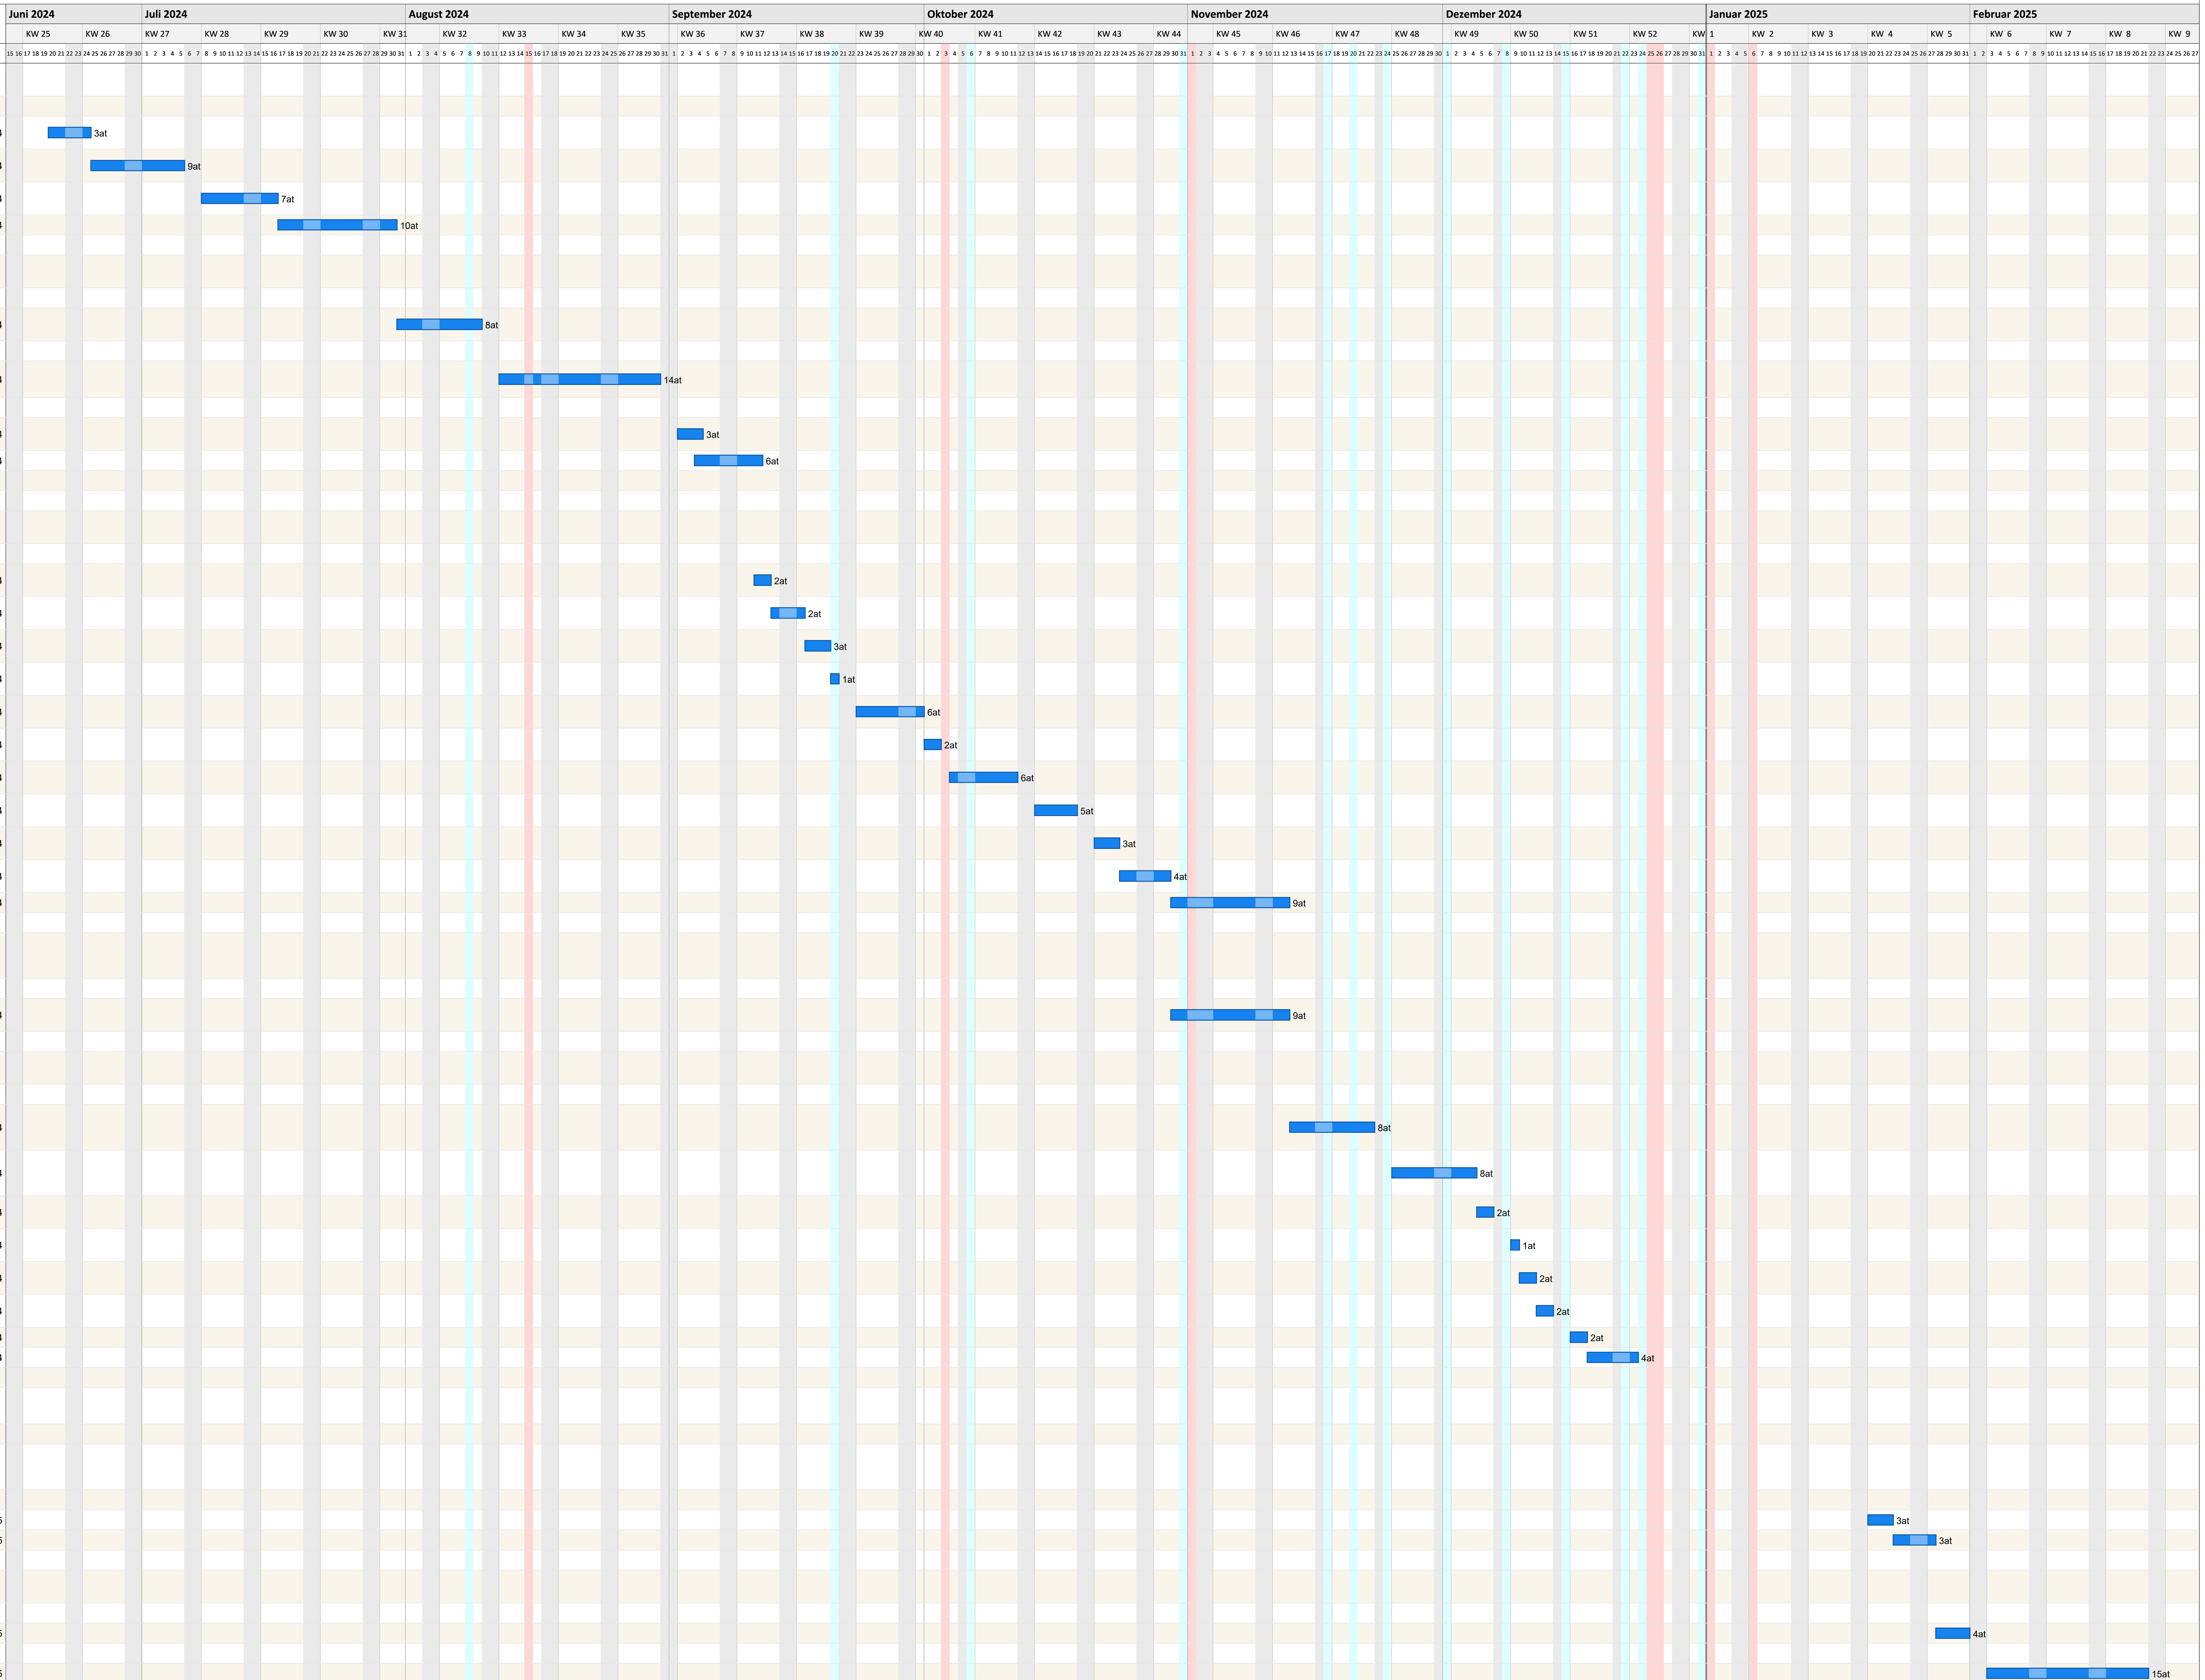

Projektzeitrahmen von Fr, 03.03.23 bis Fr, 28.02.25
Kalender: Bayern (eingebettet)
Druckdatum: 25.06.2024 11:13
Filter:
Bearbeiter: 4990

erstellt mit pro-Plan 2024 (24.0.0.5) Serien Nr.: PPL24-55F624030854 Lizenz für Gebrüder Wöhrl Grundbau GmbH, Schrobenhausen

Architektur- und Ingenieurbüro
Ihre Firma
Königslachener Weg 36
Schrobenhausen
Tel. +49 8252 90520
Fax +49 8252 905250
e-Mail: bau@gebrueder-woehrl.de
